



# UNIVERSITETET I BERGEN

## REFERAT - STYRINGSGRUPPEMØTE

<b>Prosjekt</b>	Helsecampus Årstadvollen				
<b>Organ</b>	Styringsgruppen				
<b>Sted</b>	Muséplassen 1, Kollegierommet	<b>Dato:</b>	13.03.2018		
		<b>Kl:</b>	13:00-15:00		
<b>Organisasjon</b>	<b>Navn</b>	<b>Kode</b>	<b>Innkalt</b>	<b>Forfall</b>	
Universitetet i Bergen	Dag Rune Olsen	DRO	x		
Universitetet i Bergen	Robert Bjerknes	RB	x		
Høgskulen på Vestlandet	Berit Rokne	BR	x		
Helse Bergen	Eivind Hansen	EH	x	x	
Bergen kommune	Nina Mevold	NM	x		
Haraldsplass Diakonale Sykehus	Kjerstin Fyllingen	KF	x		
Uni Research / NORCE	Aina Berg	AB	x	x	
Folkehelseinstituttet	Camilla Stoltenberg	CS	x	x	
Universitetet i Bergen - DPF	Bente Wold	BW	x	x	
Universitetet i Bergen - MED	Per Bakke	PB	x		
Universitetet i Bergen - SV	Jan Erik Askildsen	JEA	x		
Fra Universitetet i Bergen møter også:					
Arbeidsgruppen	Nina Langeland	NL	x		
Rektors kontor	Rune Indrøy	RI	x		
EIA	Even Berge	EB	x		
EIA	Helge Rekve	HR	x		
			Møtte:		
Helse Bergen	Clara Gram Gjesdal	CGG	For EH		
Uni Research	Aase Bente Groth	ABG	For AB		
Det Psykologiske Fakultet	Gro Mjeldheim Sandal	GMS	For BW		

### Sak 1-18 Godkjenning av innkalling, sakliste og referat fra forrige møte

#### Vedtak:

Innkalling, sakliste og referat fra forrige møte ble godkjent.

### Sak 2-18 Status byggetrinn 1 – Årstadveien 17

Status for byggeprosjektet inkludert brukerprosessen ble presentert i møtet av Helge Rekve og Robert Bjerknes (Vedlegg 1). Byggeprosjektet går i hovedsak etter planen, men utfordring med høy grunnvannsstand og flytting av en trafokiosk knyttet til drift av trolleybussene som går gjennom Årstadveien gjør at tidspunktet for ferdigstilling og innflytting må forskyves til våren og sommeren 2020. Planen er nå at bygget skal tas i bruk ved studiestart høsten 2020.

Brukerprosessen og status for arbeidsplassutformingsarbeidet ble også gjennomgått. Disse er i rute.

**Vedtak:**

Styringsgruppen gav sin tilslutning til arbeidet og tok saken for øvrig til orientering.

**Sak 3-18 Klyngeutvikling – rapport fra arbeidsgruppen og faggruppene**

Status for arbeidet i gruppene og planer fremover ble presentert av Nina Langeland (vedlegg 2). Faglig forum er den faggruppen som har kommet lengst med sitt arbeid, og den har arrangert flere frokostmøter den siste tiden som har vært svært godt besøkt (<http://www.uib.no/strategi/helseklynge/115226/frokost-med-folkehelse>). Faggruppen for læring og mestring er også godt i gang med arbeidet, mens faggruppene for hhv. registerforskning og innovasjon/e-helse er under etablering. Det ble i møtet fra flere pekt på de mange mulighetene som ligger i disse faggruppene, og initiativene som er tatt for å inkludere flere samarbeidspartnere fikk svært positiv mottakelse i styringsgruppen.

I diskusjonen kom det også frem at det er kommet en henvendelse fra Arendalsuka om et oppfølgingsinnslag etter fjorårets arrangement. Det ble spilt inn at i oppfølgingen av dette bør det presenteres mest mulig konkrete samarbeidsprosjekter, og at det bør være bredde i presentasjonene (f.eks. inkludere utdanning/studenter, forskning, innovasjonsprosjekter og ha med brukerperspektivet).

**Vedtak:**

Styringsgruppen gir sin tilslutning til arbeidet og tar saken for øvrig til orientering.

**Sak 4-18 Navn på helseklyngen**

Det vises til sak 9-17 der styringsgruppen behandlet og gav til tilslutning til kommunikasjonsplanen for Helsecampus Årstadvollen, og der styringsgruppen bad om å få seg forelagt en sak om navn på helseklyngen.

Navnet «Helsecampus Årstadvollen» har vært diskutert med jevne mellomrom både i arbeidsgruppen, styringsgruppen og i deler av fagmiljøene helt siden initiativet rundt å etablere en helseklynge ble tatt. I møtet redegjorde Rune Indrøy for Kommunikasjonsforums utredning og enstemmige anbefaling om å skifte navn til «Bergen helseklynge» («Bergen Health Cluster»). I tillegg ble det referert til de andre diskusjonene, bl.a. i Arbeidsgruppen, og de forslagene som forelå til møtet slik det fremgår av saksforelegget. I diskusjonen ble det fra de ulike samarbeidsinstitusjonene fremført argumenter både for Bergen helseklynge og Alrek helseklynge. Det var dog en viss overvekt for å skifte navn til Alrek helseklynge. På denne bakgrunn oppsummerte rektor ved UiB med vedtaksforslag om dette.

I etterkant av styringsgruppemøtet har rektor sendt ut en e-post (15/3-18) der det presiseres at navn på bygninger og større initiativer ved UiB må vedtas av Universitetsstyret. Det betyr at nytt navn ikke er offisielt før etter U-styrets behandling, og at nettsider og omtale i annen form for kommunikasjon ikke endres før etter det.

På denne bakgrunn blir vedtaksforslaget justert til (kfr. e-post der referatutkastet blir sendt ut):

**Vedtak:**

Styringsgruppen vedtar anbefaling om at helseklyngen skifter navn til «Alrek helseklynge» («Alrek Health Cluster»).

## **Sak 5-18 Møtedato høst 2018**

Det ble i møtet foreslått at neste styringsgruppemøte bør avholdes i november 2018.

### **Vedtak:**

Styringsgruppen vedtar at neste møtedato blir 16. november, kl. 13-15.

## **Sak 6-18 Orienteringssaker**

### **a) Utlyste samarbeidsmidler for forskning og utdanningsprosjekter i helseklyngen**

Nina Langeland orienterte om utlysningen av samarbeidsmidler og innretningen på disse (se også vedlegg 2). Det har vært stor interesse. Vurdering av innkomne søknader og tildeling vil skje i løpet av kort tid.

## **Sak 7-18 Eventuelt**

### **Studentrepresentasjon i arbeidsgruppen og styringsgruppen for helseklyngen:**

Studentgruppen har vært tett integrert i utviklingen av helseklyngen så langt, bl.a. gjennom de faglige aktivitetene (se f.eks. studentkonferansen høsten 2017: <http://www.uib.no/strategi/helseklynge/109234/studentkonferanse-om-helseklyngen-i-bergen>) og i brukerprosessen rundt utviklingen av nybygget i Årstadveien 17 gjennom representasjon i både sentral brukergruppe og undergrupper f.eks. knyttet til utforming av undervisningsarealer.

Det er kommet forslag om at også arbeidsgruppen og styringsgruppen bør ha formell representasjon av studenter, noe styringsgruppen i møtet gav sin umiddelbare tilslutning til.

Nina Langeland tar initiativ til at det oppnevnes en studentrepresentant for arbeidsgruppen, mens Robert Bjerknes sørger for at så også skjer for styringsgruppen.

## **Vedlegg: 2 stk.**

# Styringsgruppemøte Helsecampus Årstadvollen

Presentasjon til sak 2/18

Helge Rekve og Robert Bjercknes



# Status

**Brukerprosess** arbeidsplassutforming pågår – avsluttes april 2018.

- God stemning i brukermiljøene

**Bygg:** Totalentreprisekonkurranse HCA pågår - tilbudsfrist 6. april

- Grunnvannshåndtering kan fordyre prosjektet
- Prosjektoptimalisering gjennomføres parallelt
- Forberedende arbeider pågår på tomten
- Innvendig rivning ferdigstilt





# Offentlige myndigheter

- Endring til gjeldende reguleringsplan behandles i BK med målsetting om godkjenning i juni 18
- Forberedelse til rammesøknad pågår slik at denne kan godkjenne samtidig med reguleringsendring
- Infrastrukturanlegg - Trolleybuss må flyttes - planlegging i samarbeid med Bybanen pågår.





# Fremdrift - arbeidsplan


	2017			2018					2019					2020														
Aktivitet	okt	nov	des	jan	feb	mar	apr	mai	jun	jul	aug	sep	okt	nov	des	jan	feb	mar	apr	mai	jun	jul	aug	sep	okt	nov	des	
Offentlige myndigheter regulering	■	■	■	■	■	■	■	■																				
Rammesøknad		■	■	■	■	■	■	■																				
Øvrige rammebetingelser	■	■	■	■	■	■	■	■																				
Konkurransesgrunnlag	■	■	■																									
Utlysning			■																									
Prekval, regning, evaluering, kontrakt		■	■	■	■	■	■	■																				
Brukerprosess		■	■	■	■	■	■	■																				
Forberedende arbeider			■	■	■	■	■	■	■																			
Optimalisering med entreprenør								■	■	■	■	■																
Riving								■	■	■	■	■																
<b>Beslutning om oppstart bygging</b>												■																
Bygging																												





# Brukerprosess – noen milepæler


- Interessekartlegging – Vinter 2016
- Intensjonsavtaler HVL/BK/UNI og UIB – Vår 2016
- **Sentral brukergruppe** nedsettes – August 2016
- Faglig avspark – Solstrandseminaret, august 2016
- Romprogramarbeid startes – lokale brukerprosesser – Høst 2016
- Konsept 1 for bygget presentert – Høst 2016
- Brukerprosesser – Klinikktutforming, undervisningsarealer, enkeltkontorer vs. åpnere landskaper
- Konsept 2 valgt - Januar 2017
- Høringsrunder og beslutning videreføring – Mars 2017
- Innplassering av brukermiljøer i bygget – Høst 2017
- Designbasis besluttet – Desember 2017
- Prosess arbeidsplassutforming – Vår 2018  
v/ Mellomrom Arkitekturpsykologi

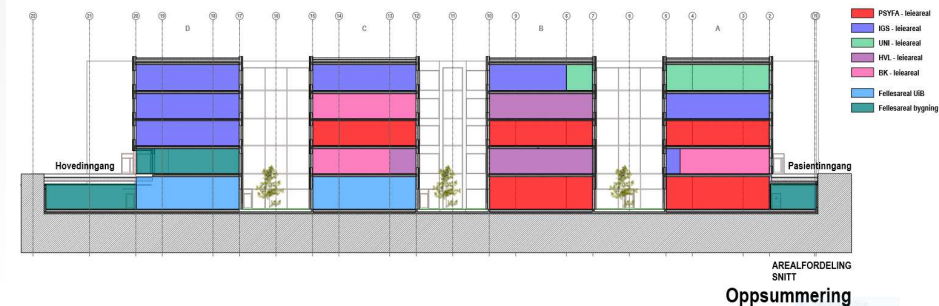





# Arbeidsplassutforming vår 2018

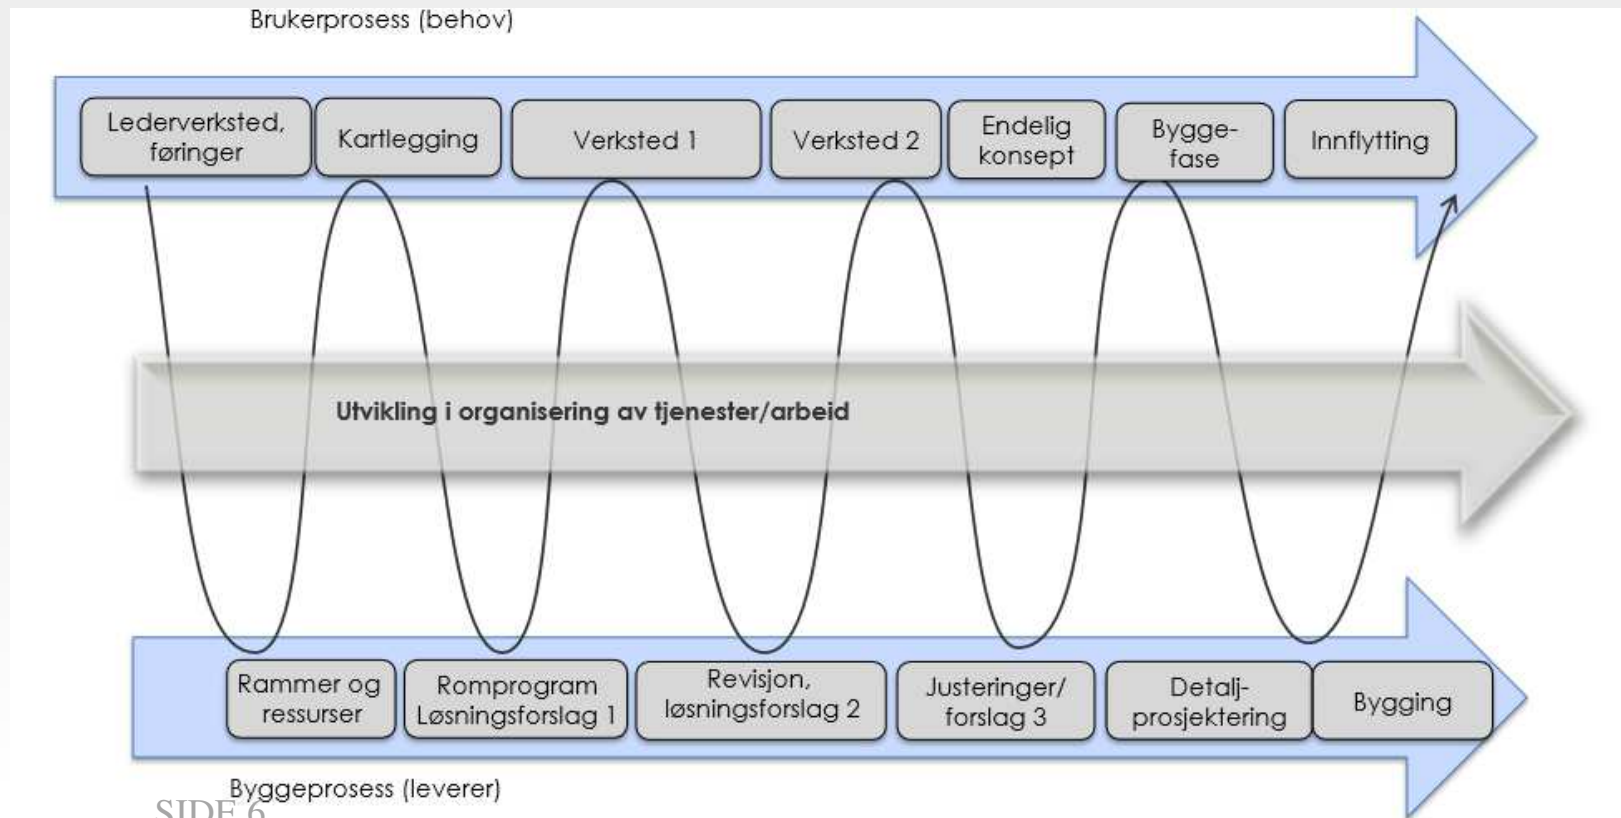

# Fremdrift - arbeidsplassutforming

Bruker	Ledelse- forankring	Kartlegging	WS 1	WS 2
IKP	jan	Jan/feb	22.03	12.04
IBMP	jan	mars	mars	april
HEMIL	jan	feb	06.03	09.04
IGS	feb	feb	12.03	03.04
UNI+IGS	feb	feb	20.03	17.04
HVL	mars	mars	09.03	06.04
BK	mars	mars	09.03	06.04





350 arbeidsplasser

DPF – IKP,HEMIL,IBMP  
MED – IGS  
UNI Research / NORCE  
Bergen Kommune  
Fjellsiden legesenter  
Høyskolen på Vestlandet

og



500 studenter

# Styringsgruppemøte Helsecampus Årstadvollen

Presentasjon til sak 3/18


Nina Langeland

 Høgskulen  
på Vestlandet

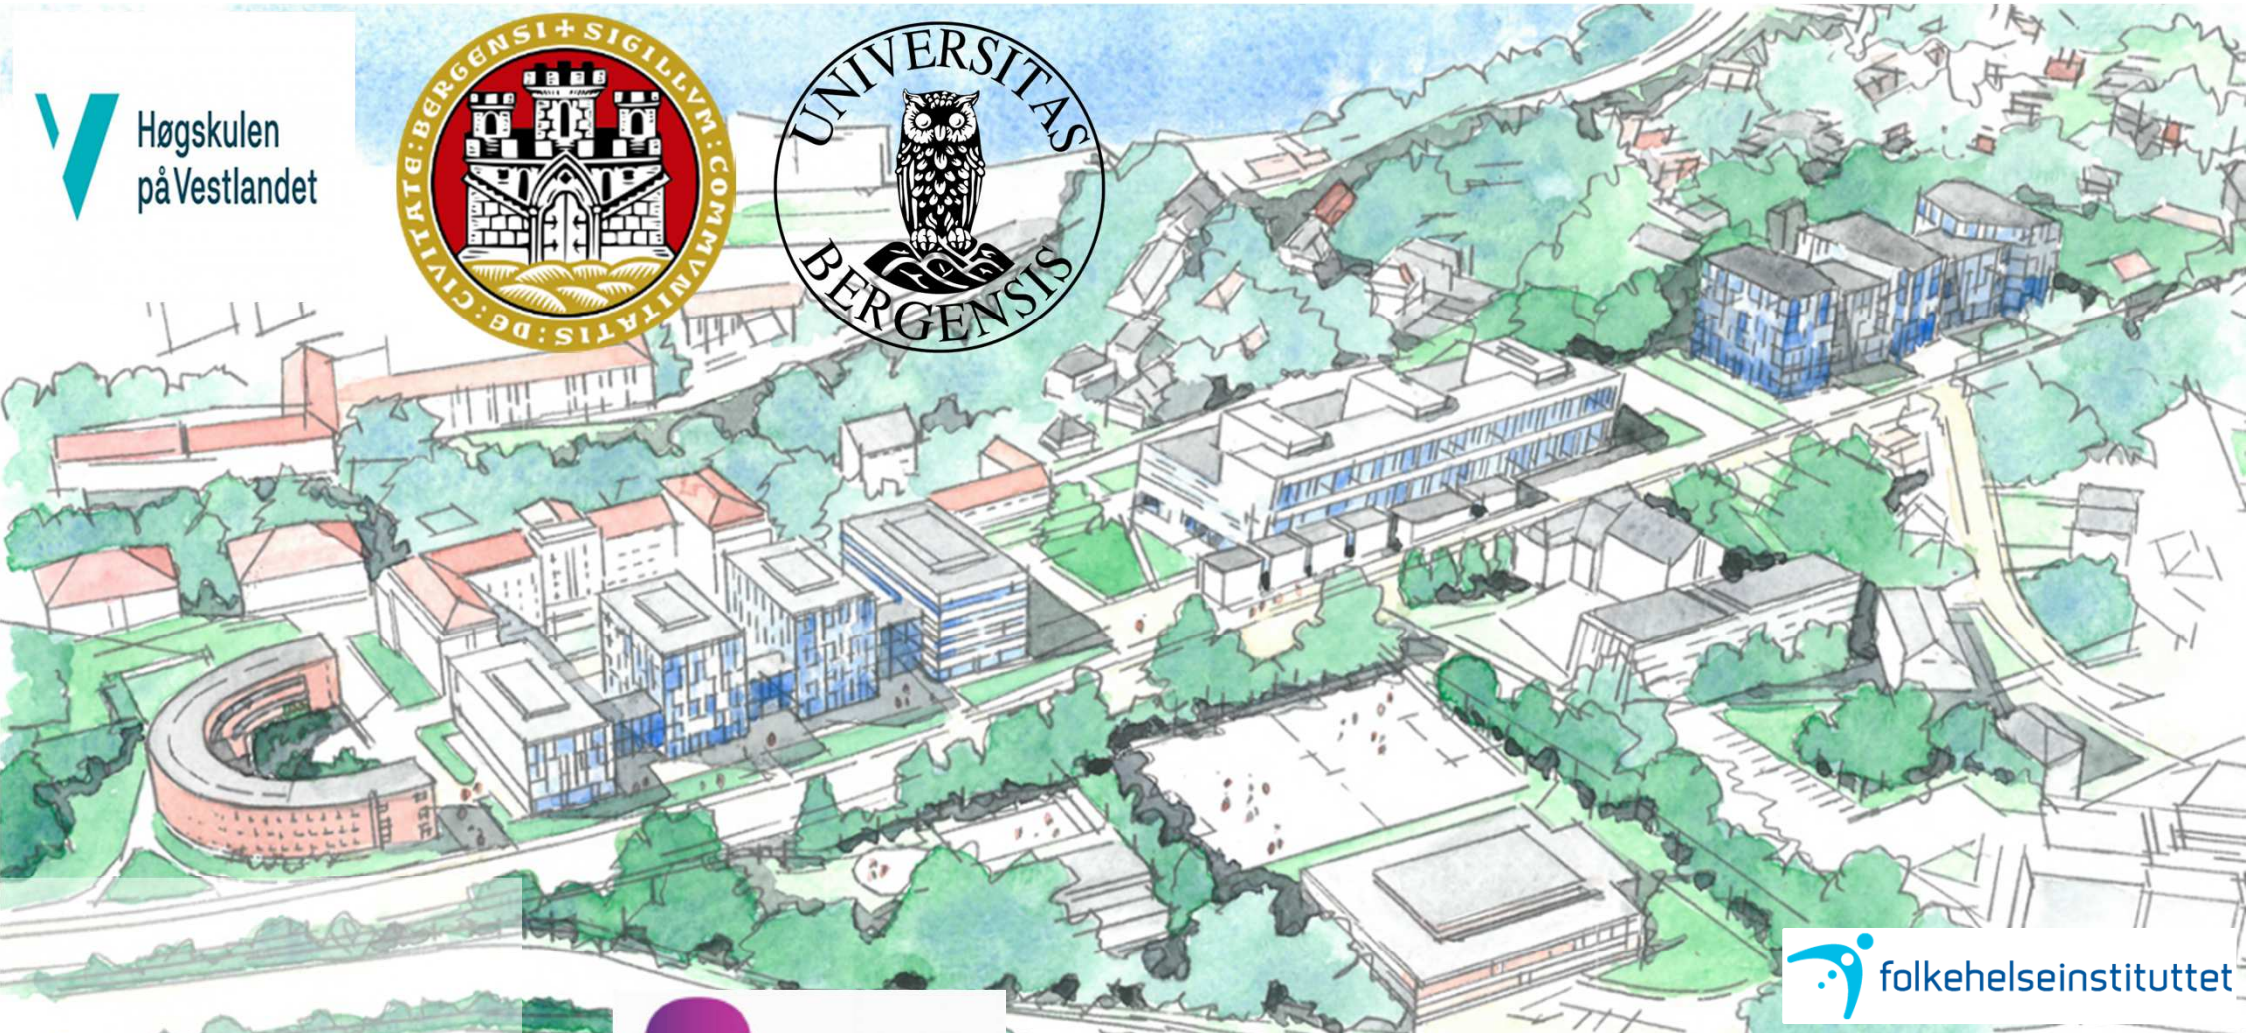

## Felles organisasjonskart, Helsecampus Årstadvollen

Nye faggrupper oktober 2017

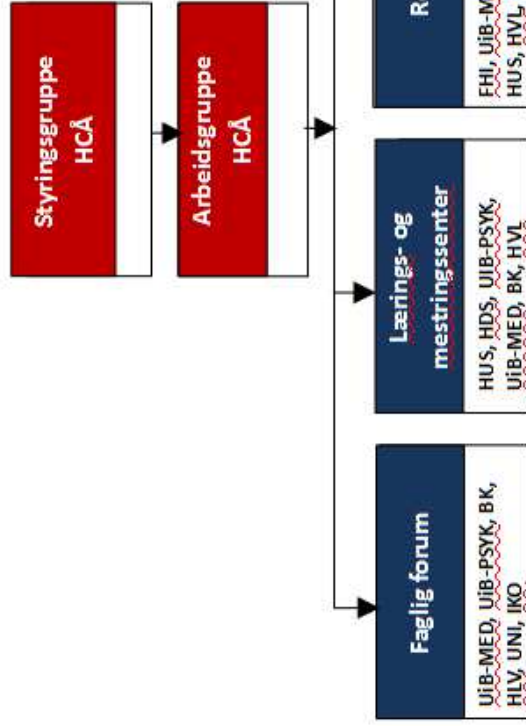


# Samarbeidsmidler HCA

- Utlyst 500.000 til partnere som skal flytte til Årstadveien 17
  - Minst tre partnere, inkludert kommune
  - Avsatt midler til studentprosjekter
- Frokostmøter januar/februar 2018
  - Allmenmedisinsk forskningsnettverk
  - Teknologi i helse og omsorg
  - IT-forskning bidrar til økt tilgang til psykolog-behandling
  - Folkehelse – mer enn helsetjenester
- Student-initiert møte om ME 15. mars

Bergen kommune tilbyr ny teknologispakke som øker tryggheten for innbyggere.

Kommunen holder nå på å innføre nye teknologier som øker tryggheten for innbyggere. Dette inkluderer blant annet varsler og alarmmottak, hjemmetjenester og medisineringstøtte som varsler brukere om når det er på tide å ta medisiner som er foreskrevet.



## Å motivere innbyggere

### Rekruttere og trenere innbyggere

Vi vil prøve en trygghetspakke som øker tryggheten for innbyggere. Kommunen holder på å innføre nye teknologier som øker tryggheten for innbyggere. Dette inkluderer blant annet varsler og alarmmottak, hjemmetjenester og medisineringstøtte som varsler brukere om når det er på tide å ta medisiner som er foreskrevet.



BERGEN KOMMUNE





Else Aares på møte om teknologi i helse og omsorg

## Årshjul - Arbeidsgruppen for Helsecampus Årstadvollen

Møtenummer	2018 - vår	Sak
Møte 1 vår	Torsdag 4. januar	Fast orientingssak i alle møter: Rapport fra byggearbeid og brukergruppe  Rapportering fra Faglig forum
Møte 2 vår	Torsdag 22. februar	
Møte 3 vår	Torsdag 5. april	Samarbeidsmidler – vedtak om fordeling
Møte 4 vår	Torsdag 24. mai	Rapportering fra faggruppe LMS  Samarbeidsmidler for 2019 – innspill til rammer fra Faglig forum
Møte 5 vår	Torsdag 14. juni (ved behov)	
Møtenummer	2018 - høst	Sak
Møte 1 høst	September	Rapportering fra Faglig forum
Møte 2 høst	Oktober	Rapportering fra faggruppe Registre
Møte 3 høst	November	Rapportering fra faggruppe Innovasjon og e-helse
Møte 4 høst	Desember (ved behov)	Rapportering på samarbeidsmidlene for 2018  Rapportering fra faggruppe LMS (ved behov)
